



پروژه برج مسکونی ۲۵ طبقه ی حکیم نظامی (صداوسیما)

موضوع: گزارش پیشرفت کار هفتگی

تاریخ ۹۶/۰۹/۱۸ الی ۹۶/۰۹/۲۴

کارفرما: تعاونی مسکن صدا سیما

پیمانکار: شرکت سامکو (هنرکار)

مشاور: شرکت شاخص ستون پارسیان

تعاونی مسکن صداوسیما
شماره ۳۵۰
تاریخ ۲۴/۰۹/۹۶



عملیات انجام شده:

سفت کاری:

اجرای دیوار چینی بالای درب آسانسور طبقات ۱ الی ۵

اجرای عملیات پوشش ضد حریق در زیرزمین ۲- (در حال اجرا)

اجرای دیوار جانبی آسانسور ضلع شرقی با استفاده از نبشی، میلگرد و رابیتس در طبقات ۳- الی ۱۱

اجرای نرمة کشی روی دیوار جانبی آسانسور در طبقات ۳- الی ۴

نظافت کف واحدها

حمل مصالح به طبقات

تاسیسات مکانیکی:

اجرای لوله های سرد و گرم طبقه اول واحد C-D-E

اجرای لوله های مسی کولر گازی طبقه ۱

تازک کاری:

اجرای سرامیک کف سالن واحد غربی از طبقه ۱۹

اجرای سنگ کف طبقه ۲۲ (زیر سقف هلی پد)

تکمیل سفید کاری سقف راهرو واحد غربی از طبقه ۲۱ و مشغول کار در اتاق خواب واحد شرقی

سنگ کاری سنگ پله ضلع غربی و شرقی درزیر زمین ۳-

شروع مجدد نصب پتل های گچی سقف در واحد A-B از طبقه ۵

نصب پنجره های UPVC در طبقه ۲ جهت بازدید و تایید



سفت کاری:

اجرای پوشش ضد حریق (زیرزمین ۲-)






رأبش بندى دیوار جانبى آسانسور





اجرای آستر سیمان روی دیوار چایی آستانور

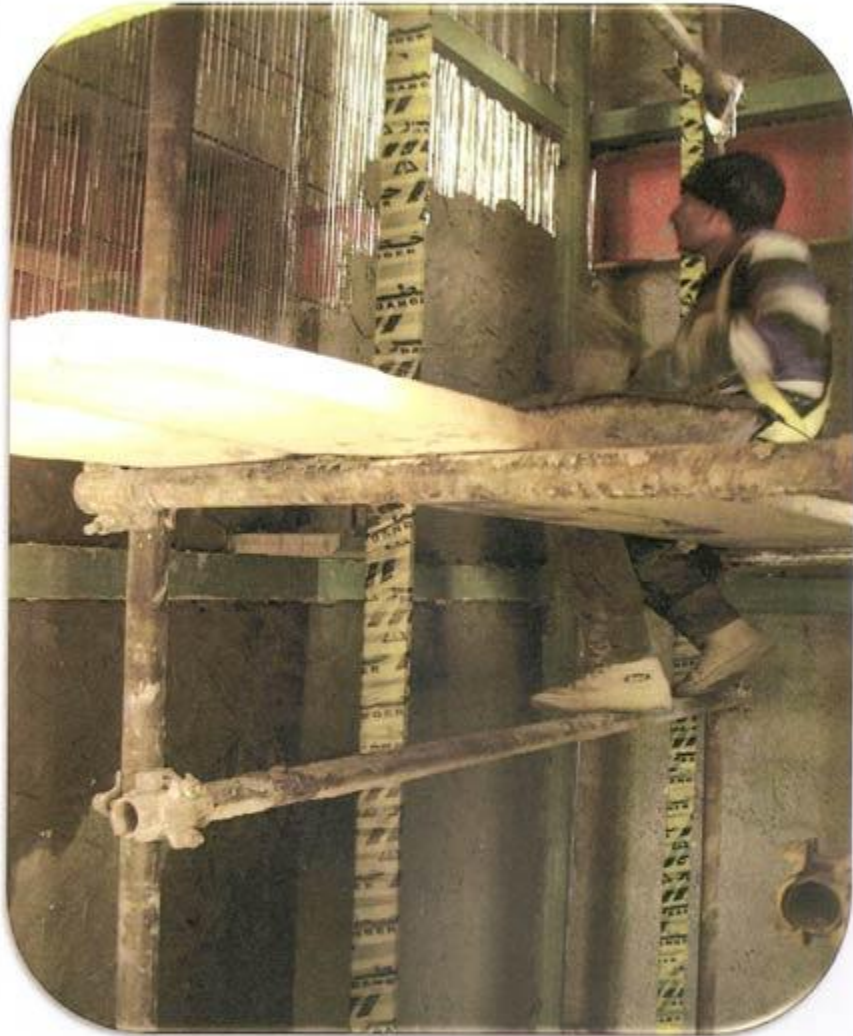

نظافت کف واحدها



اجرای لوله های سرد و گرم طبقه ۱




اجرای نوله سسی کولو گازی طبقه ۱





اجرای سرامیک کف سالن واحد غربی طبقه ۲۱

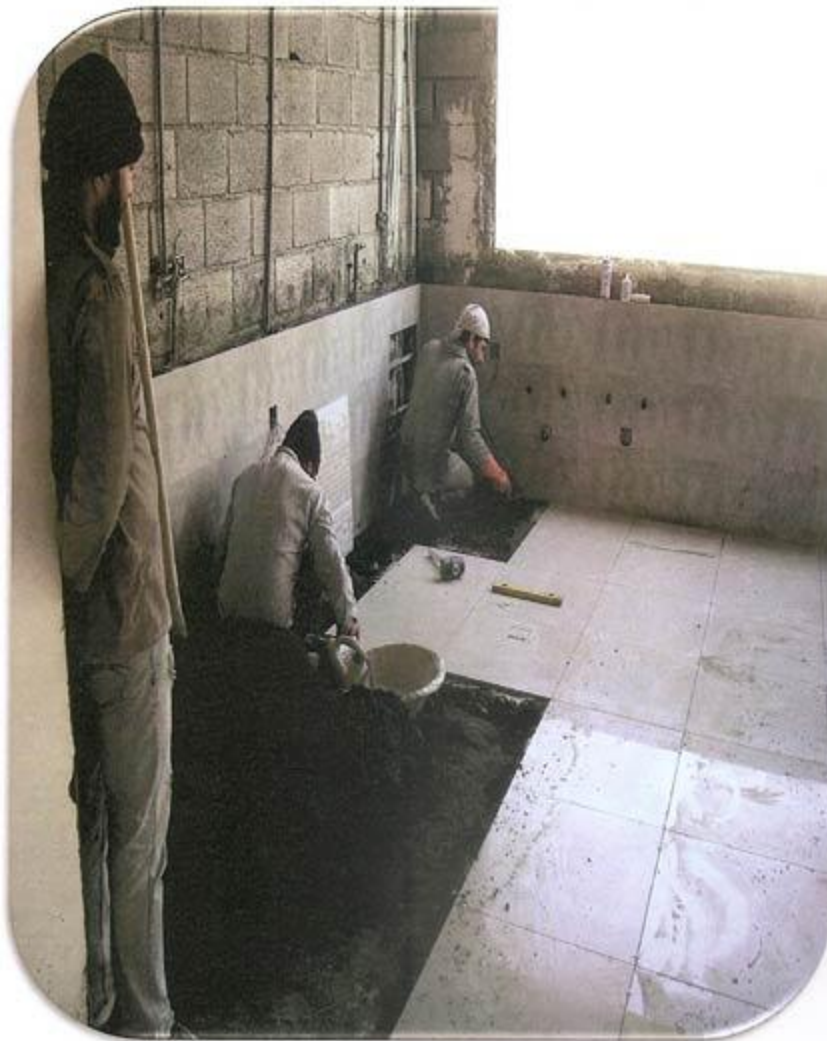

اجرای سنگ کف طبقه ۲۲ (زیر هلی پد)



سفید کاری سقف راهرو واحد غربی طبقه ۲۱



سفید کاری سقف اتاق خواب واحد شرقی طبقه ۲۱

اجرای سقف کتاف واحد F طبقه ۵



نصب پنجره PVC در طبقه ۲

