



پروژه برج مسکونی ۲۵ طبقه ی حکیم نظامی (صداوسیما)


موضوع: گزارش پیشرفت کار هفتگی

تاریخ ۹۶/۰۸/۲۶ الی ۹۶/۰۹/۱۰

کارفرما: تعاونی مسکن صدا سیما

پیمانکار: شرکت سامکو (هنرکار)

مشاور: شرکت شاخص ستون پارسیان





## عملیات انجام شده:

### سفت کاری:

اجرای دیوار چینی دور قاب درب آسانسور طبقات ۵ الی ۲۱

اجرای دیوار چینی دور داکت فاضلاب

اجرای رابیتس کاری سقف کاذب واحد شرقی طبقه ۲۱

اجرای جوشکاری شمشیری پله هلی پد (در حال اجرا)

اجرای ضد زنگ شاسی آسانسور از طبقه ۱۰ الی ۲۱

نظافت کف لابی طبقات برای اجرای سنگ کف و نظافت واحدها

حمل مصالح به طبقات

### تاسیسات مکانیکی:

اجرای لوله فاضلاب خطوط اصلی و طبقه اول

اجرای لوله های مسی کولر گازی در سالن طبقه ۱۷

### تاسیسات برقی:

اجرای لوله برق از سقف و عبور سیم در طبقه ۲۱ واحد شرقی

## نازک کاری:

اجرای سنگ کف لابی طبقات ۲ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۱ (سنگ دور آسانسور ها به دلیل عدم دیوار چینی هنوز اجرا نشده)

سفید کاری سقف سالن و آشپزخانه واحد غربی و مشغول کار در اتاق خواب از طبقه ۲۱

سفید کاری دیوار واحد شرقی از طبقه ۲۱ و تکمیل آن

سنگ کاری کف راه پله ضلع غربی طبقات ۱۵ الی ۱۹

شروع سنگ کاری کف بام طبقه ۱۷ ضلع شرقی (مشغول اجرا)



سفت کاری

دیوار چینی دور قاب آسانسور



دیوار چینی دور داکت




رابطس کاری سقف واحد شرقی طبقه ۲۱






اجرای شمشیری پله هلی پد

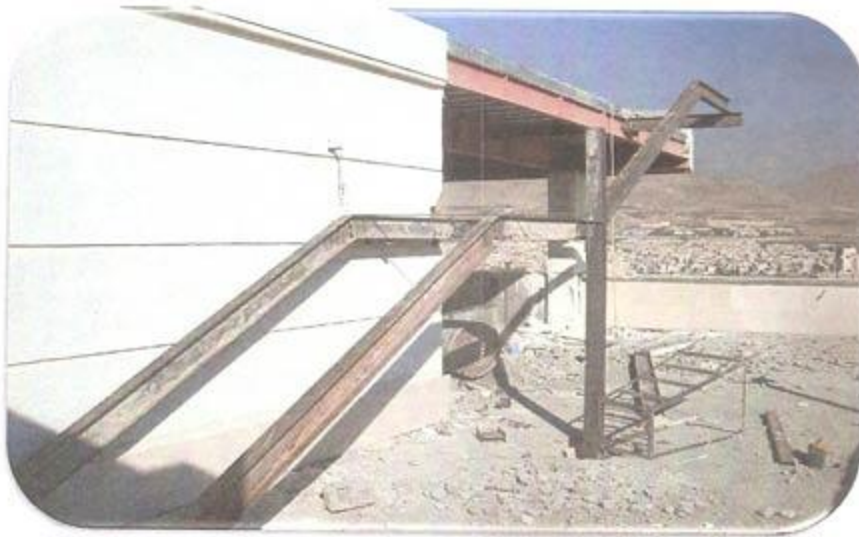

نظافت واحدها

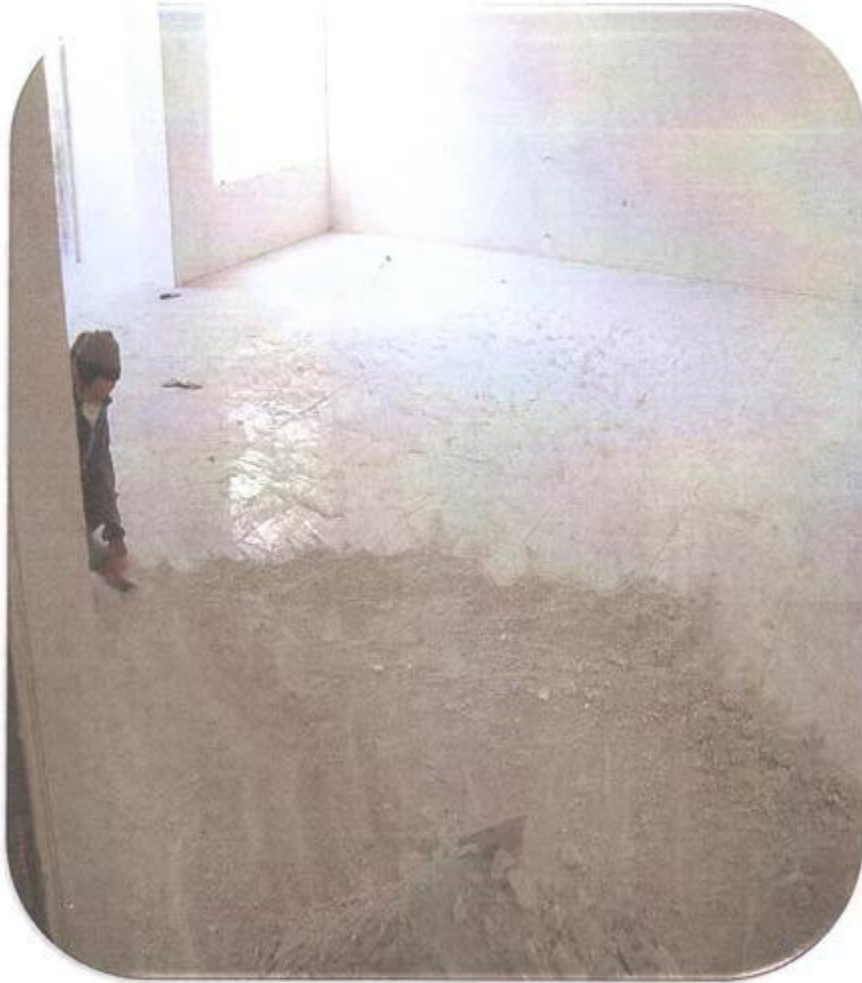





اجرای لوله های فاضلاب طبقه اول و جمع آوری آن ها




اجرای سیم کشی برق سقف در واحد شرقی طبقه ۲۱

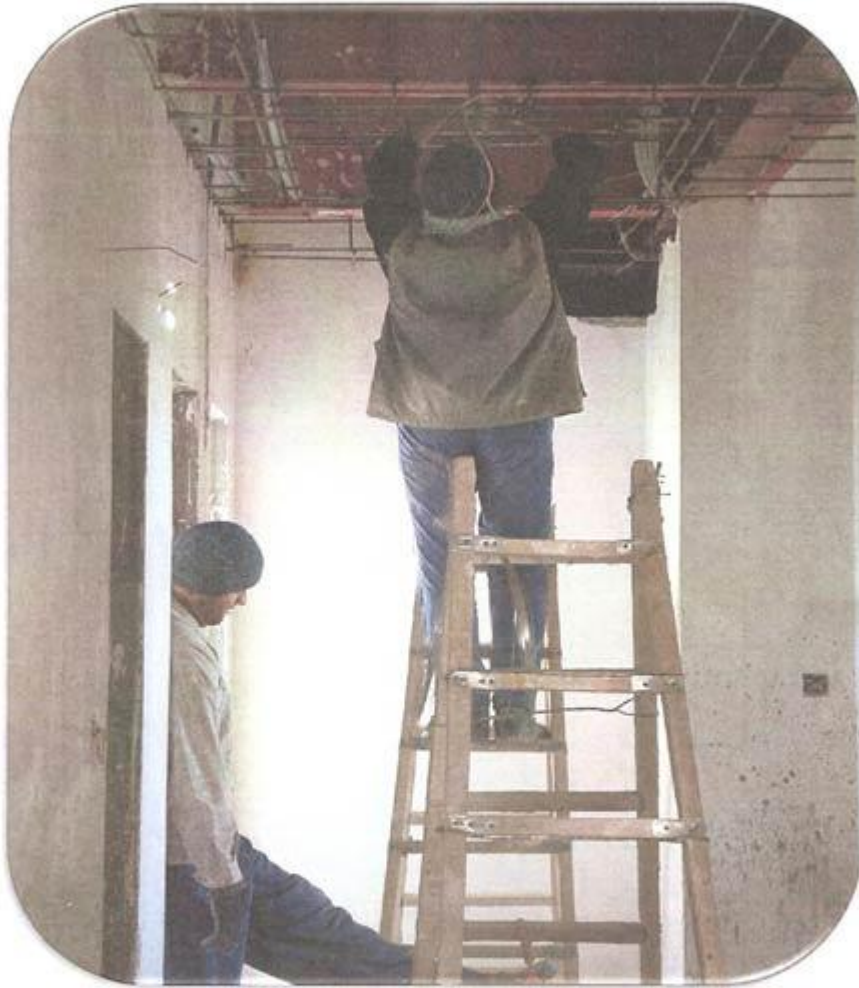


اجرای سنگ کف لابی

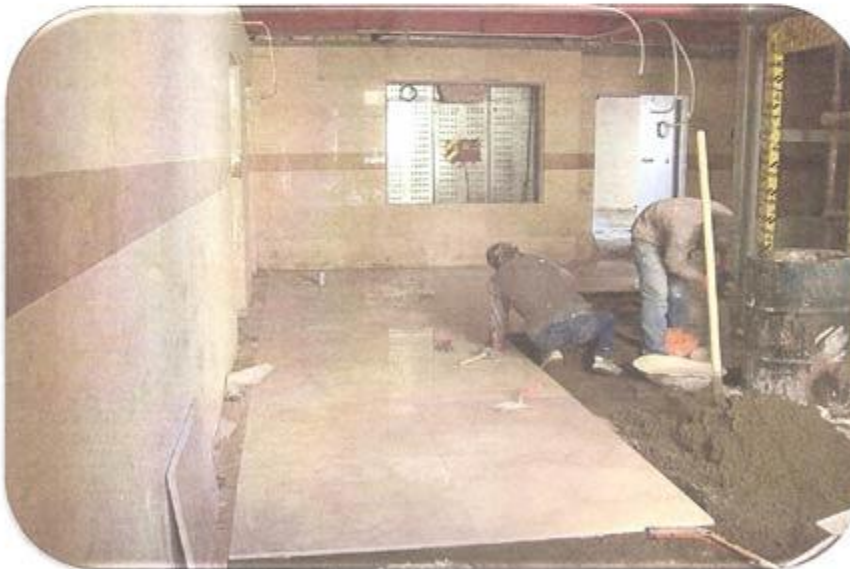

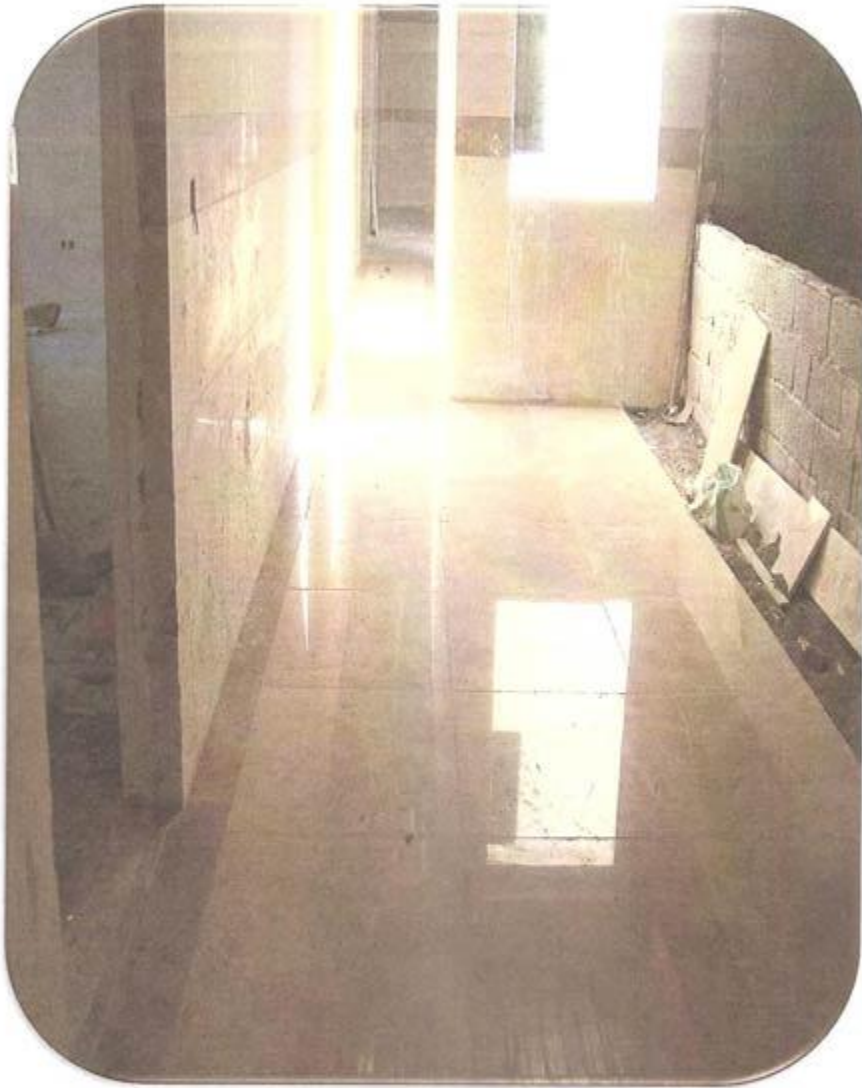



سفید کاری سقف سالن واحد غربی طبقه ۲۱

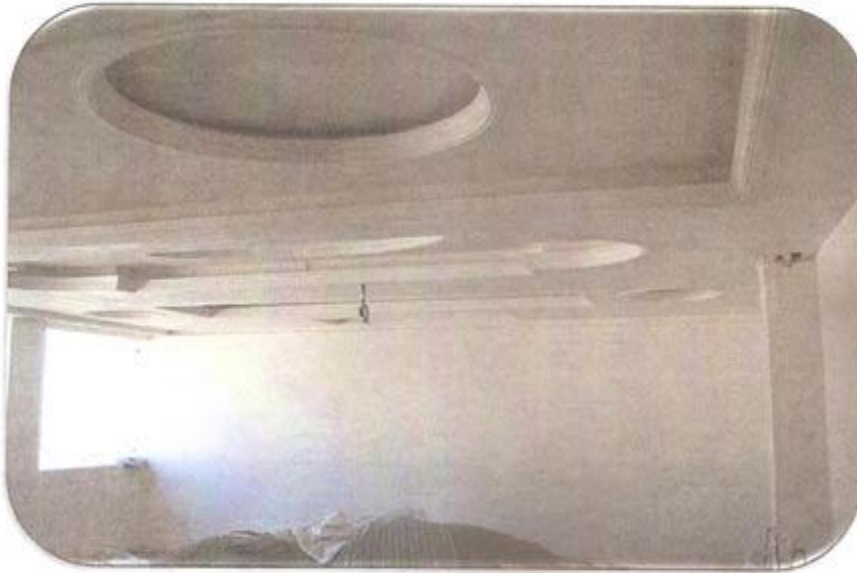

اجرای سنگ پله طبقه ۱۸ ضلع غربی



اجرای سنگ گد، پام طبقه ۱۷ ضلع شرقی

